

MAINTENANCE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL (CESI) BUDERUS

13240 Septèmes-les-Vallons | Bouches du Rhône (13) ref : 62267



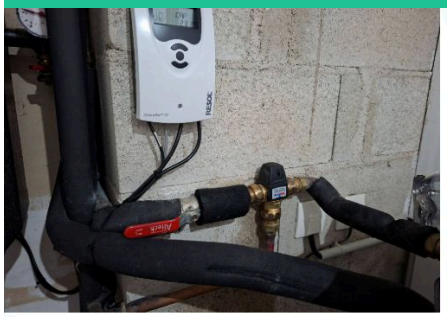

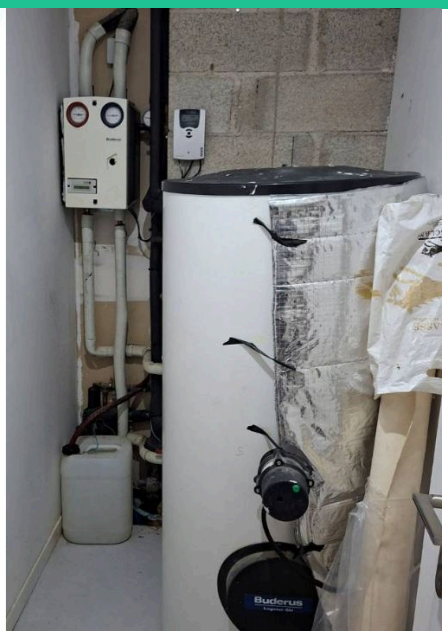

Fiche en ligne

SAINTE-VICTOIRE ENERGIE

SAINTE-VICTOIRE ENERGIE

Chantier réalisé en : 2026

J'ai été contacté dans le cadre d'une maintenance curative sur ce chauffe-eau de marque BUDERUS, qui n'avait pas subi d'entretien depuis plusieurs années.

Dans un premier temps, le remplacement du liquide caloporteur (glycol) s'avérait indispensable. Par la même occasion, l'anode en magnésium, assurant la protection de la cuve était aussi nécessaire. Le vase d'expansion était également défaillant et a été remplacée par une vase de 18litres de marque REFLEX.

Lors des essais, il s'est avéré que la régulation de marque BUDERUS était défaillante et ne pilotait plus le circulateur, cette dernière a donc été remplacée par une régulation RESOL CS/2, les sondes placées dans les capteurs solaires et le ballon ont été également remplacées car non compatibles avec la nouvelle régulation. En préventif, le mitigeur thermostatique solaire a également été remplacé.

Le système est maintenant parfaitement efficient, un entretien régulier tous les 4 à 5 ans sera nécessaire pour remplacer le liquide caloporteur et l'anode magnésium en préventif.

SAINTE-VICTOIRE ENERGIE

★★★★★
(5/5 pour 27 avis)

SAINTE-VICTOIRE ENERGIE
28 Chemin du Belvédère 13100

https://www.sve.solar/
cdubent@sve.solar

RGE QualiPv

RGE RECONNU GARANT ENVIRONNEMENT
